

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1734	05 de mayo 2020	\$ 70.000.000,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
17857	09 de Julio 2020	\$ 42.518.855,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ N/A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ N/A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ	
CARGO	JEFE RED DE DATOS UDNET	
SEDE	CALLE 40	
CORREO ELECTRONICO	Udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1302
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101119318					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	17	MES	07	AÑO	2020

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$4,251,885.50	17	07	2020	20	10	2021
Calidad	\$8,503,771.00	17	07	2020	20	07	2022

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y dos millones quinientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos (\$ 42.518.855,00). Dicho valor contiene todos los costos, directos e indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y dos millones quinientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos (\$ 42.518.855,00). Dicho valor contiene todos los costos, directos e indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	Cuarenta y dos millones quinientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos (\$ 42.518.853,00).
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	Dos pesos (\$ 2).

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

Se está realizando el proceso de cierre de expediente

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 AÑOS

Porcentaje avance en tiempo: 48%

Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 98%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: 98%

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ SI X

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

ITEM	Nombre de tarea	% completado
1	INICIO	100%
1.1	Firma de acta de inicio	100%
2	Adquisición de soporte fabricante	100%
2.1	Proceso de compra	100%
2.2	Entrega de soporte por fabrica	100%
3	Activación e instalación de soporte	100%
3.1	Activación de soporte en Portal Ruckus	100%
3.2	Instalación de Archivo de soporte en Controladora	100%
3.3	Pruebas y validación de renovación de soporte	100%
4	Asignación de usuario Ruckus	100%
4.1	Creación y asignación de usuario de acceso al portal Ruckus	100%
5	Transferencia de conocimiento	100%
5.1	Transferencia de conocimiento en el lugar indicado sesión 1 * 2H	100%
5.2	Transferencia de conocimiento en el lugar indicado sesión 2 * 2H	100%
5.3	Transferencia de conocimiento en el lugar indicado sesión 3 * 2H	100%
6	Entrega de documentación	100%
6.1	Entrega de soportes de Renovación	100%
6.2	Entrega de documentación técnica	100%
7	Facturación	100%
7.1	Entrega de Factura	100%
8	Gestión y soporte	48%
8.1	Activación de soporte en portal Ruckus y Avance tiempo gestión y soporte	48%

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS N° 1239 DEL 17 DE JULIO DE 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS N° 1239 DEL 17 DE JULIO DE 2020

Por lo anterior se firma a los **05** días del mes de **ENERO** de **2021**.



Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Walter Eduardo Pinilla Tenorio	CPS UDNET		05/01/2021
Revisó	Laura Betancourt	CPS UDNET		05/01/2021
Aprobó	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe UDNET		05/01/2021


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.


		Modo	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% Completado	j	v	s	d
1			CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA DE LA PLATAFORMA INALÁMBRICA MARCA RUCKUS® COMPUESTA POR CONTROLADORAS INALÁMBRICAS Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO INDOOR Y OUTDOOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	vie. 17/07/20 5	mié. 28/07/21	91%				
2			INICIO	vie. 17/07/20 8	mar. 21/07/20	100%				
3			Firma de acta de inicio	vie. 17/07/20 8	mar. 21/07/20	100%				
4			Adquisicion de soporte fabricante	mar. 21/07/20	mié. 22/07/20	100%				
5			Proceso de compra	mar. 21/07/20	mar. 21/07/20	100%				
6			Entrega de soporte por fabrica	mié. 22/07/20	mié. 22/07/20	100%				
7			Activacion e instalacion de soporte	mié. 22/07/20	vie. 31/07/20 1	100%				
8			Activacion de soporte en Portal Ruckus	mié. 22/07/20	mar. 28/07/20	100%				
9			Instalacion de Archivo de soporte en Controladora	mié. 29/07/20	mié. 29/07/20	100%				
10			Pruebas y validacion de renovacion de soporte	jue. 30/07/20 8	vie. 31/07/20 1	100%				
11			Asignacion de usuario Ruckus	vie. 24/07/20 8	lun. 27/07/20 1	100%				
12			Creacion y asignacion de usuario de acceso al portal Ruckus	vie. 24/07/20 8	lun. 27/07/20 1	100%				
13			Transferencia de conocimiento	lun. 3/08/20 8:	mié. 5/08/20 1	100%				
14			Transferencia de conocimiento en el lugar indicado sesion 1 * 2H	lun. 3/08/20 8:	lun. 3/08/20 18	100%				
15			Transferencia de conocimiento en el lugar indicado sesion 2 * 2H	mar. 4/08/20 8	mar. 4/08/20 1	100%				
16			Transferencia de conocimiento en el lugar indicado sesion 3 * 2H	mié. 5/08/20 8	mié. 5/08/20 1	100%				
17			Gestion y soporte	mié. 29/07/20	mié. 28/07/21	48%				


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital
Fecha: mar. 5/01/21 12:13


Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

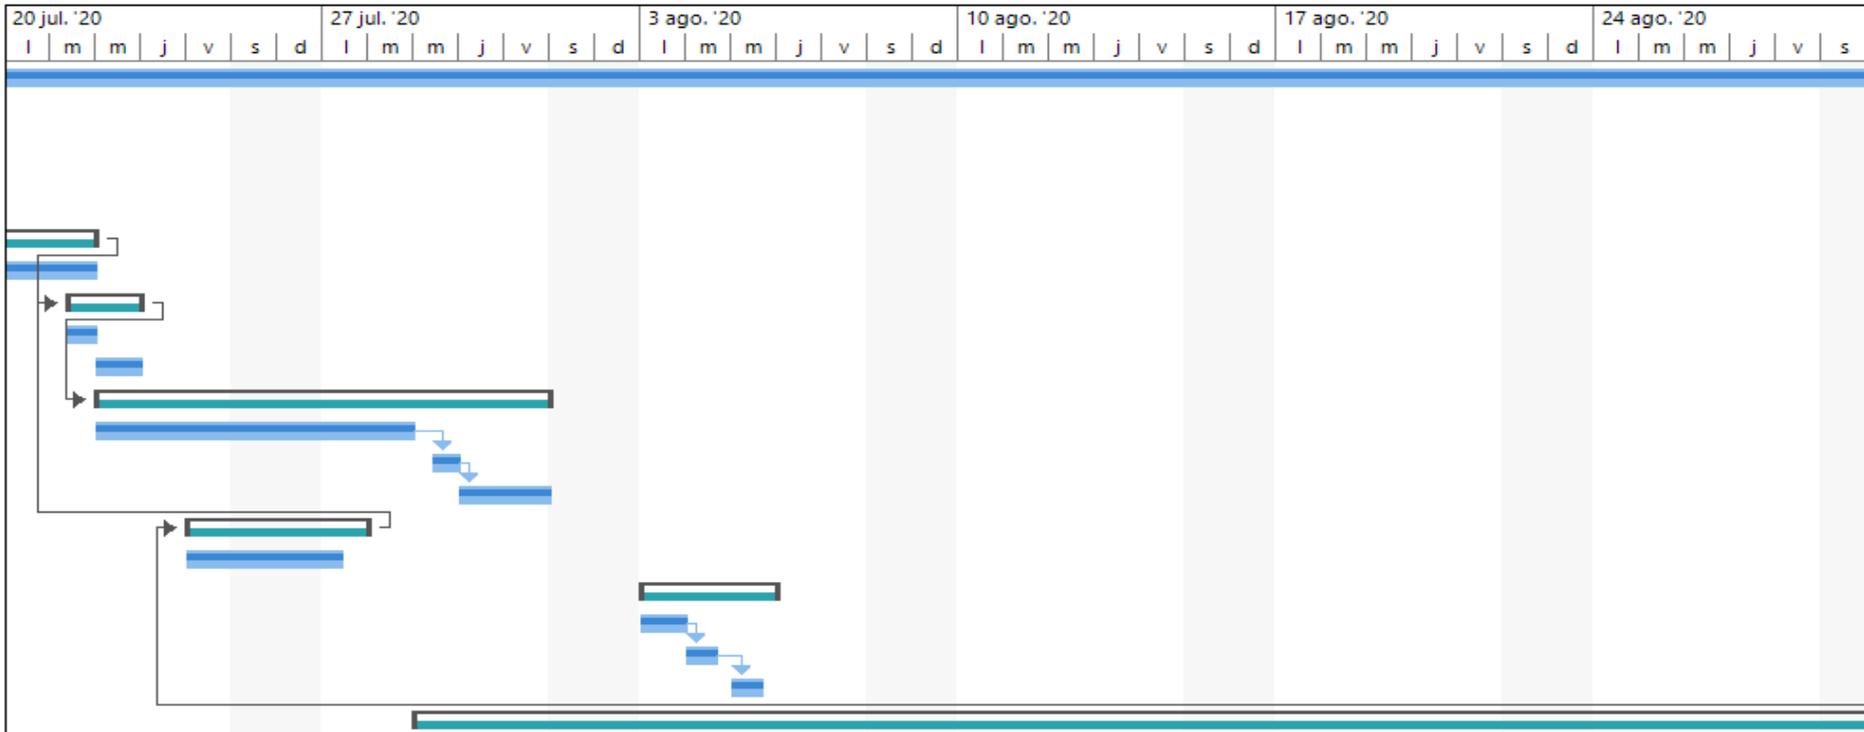


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

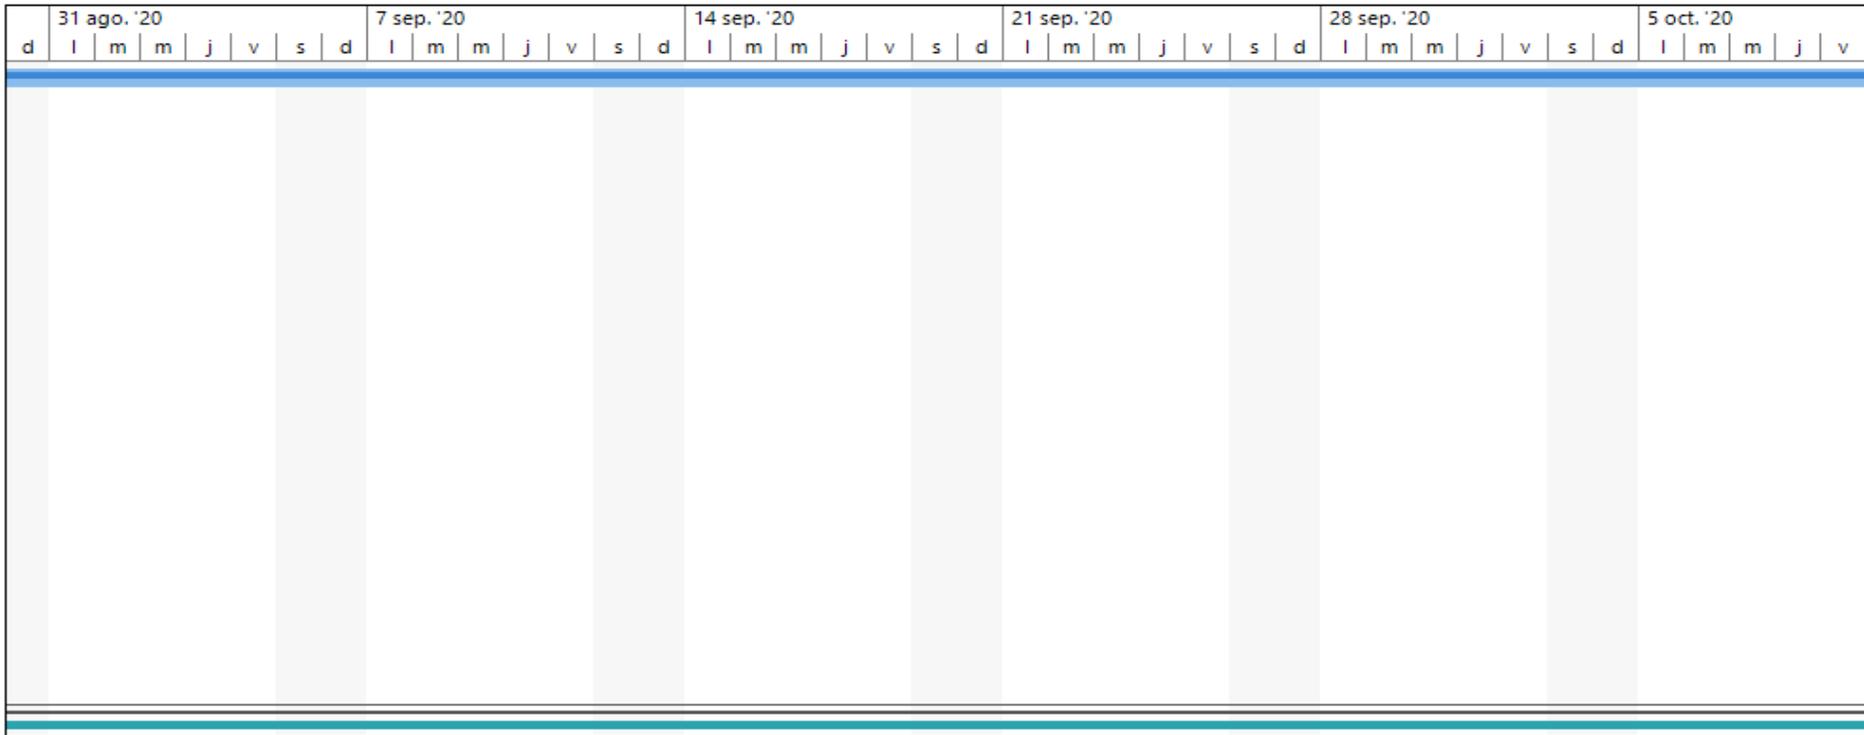


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

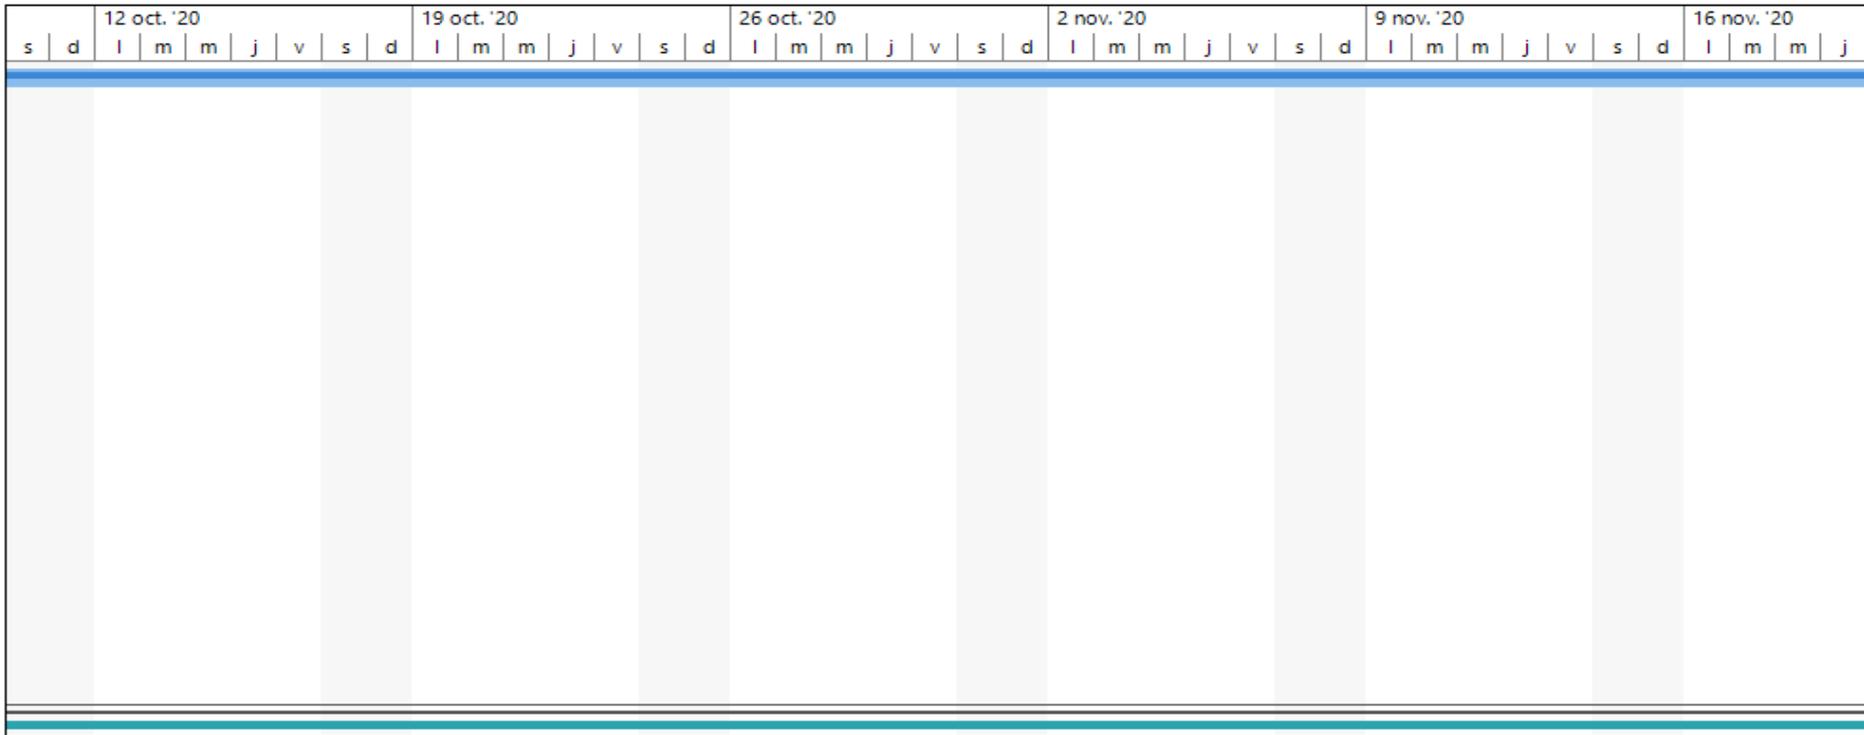



Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

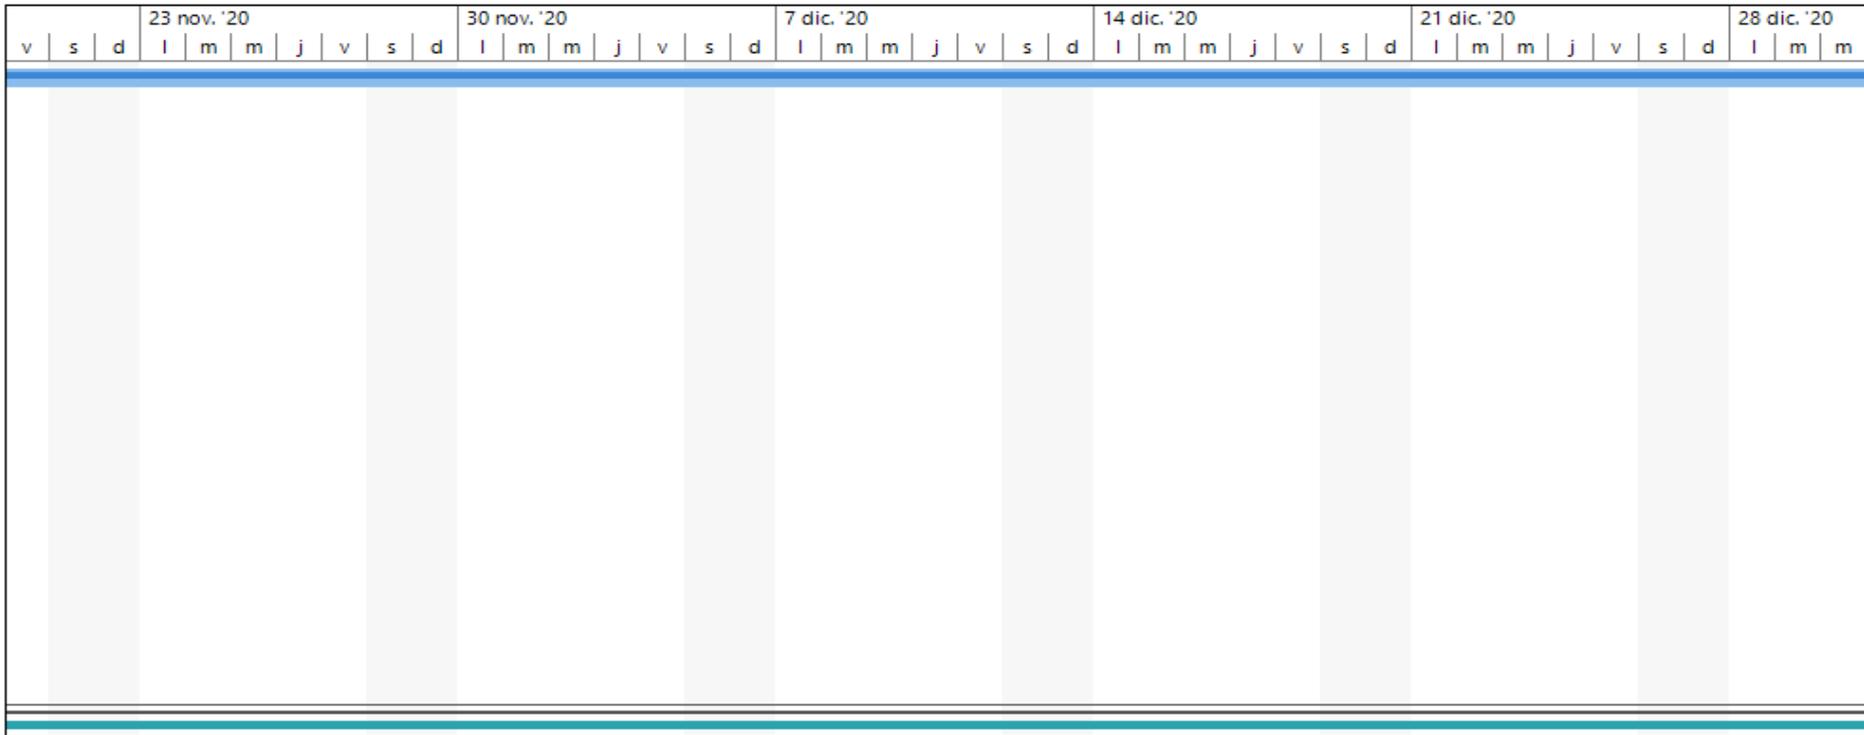


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

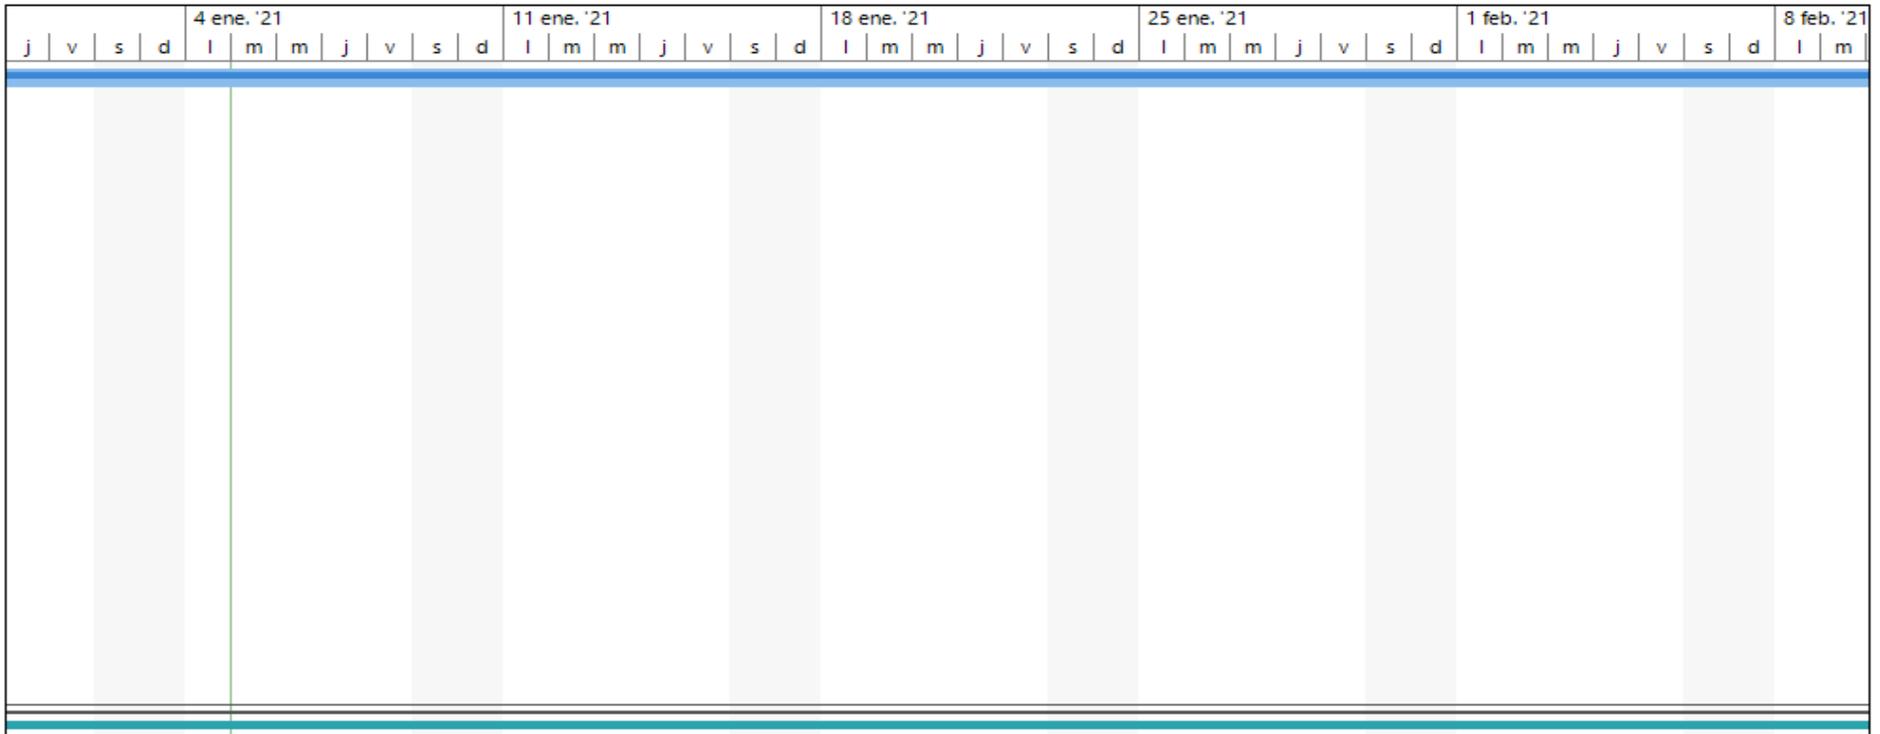


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

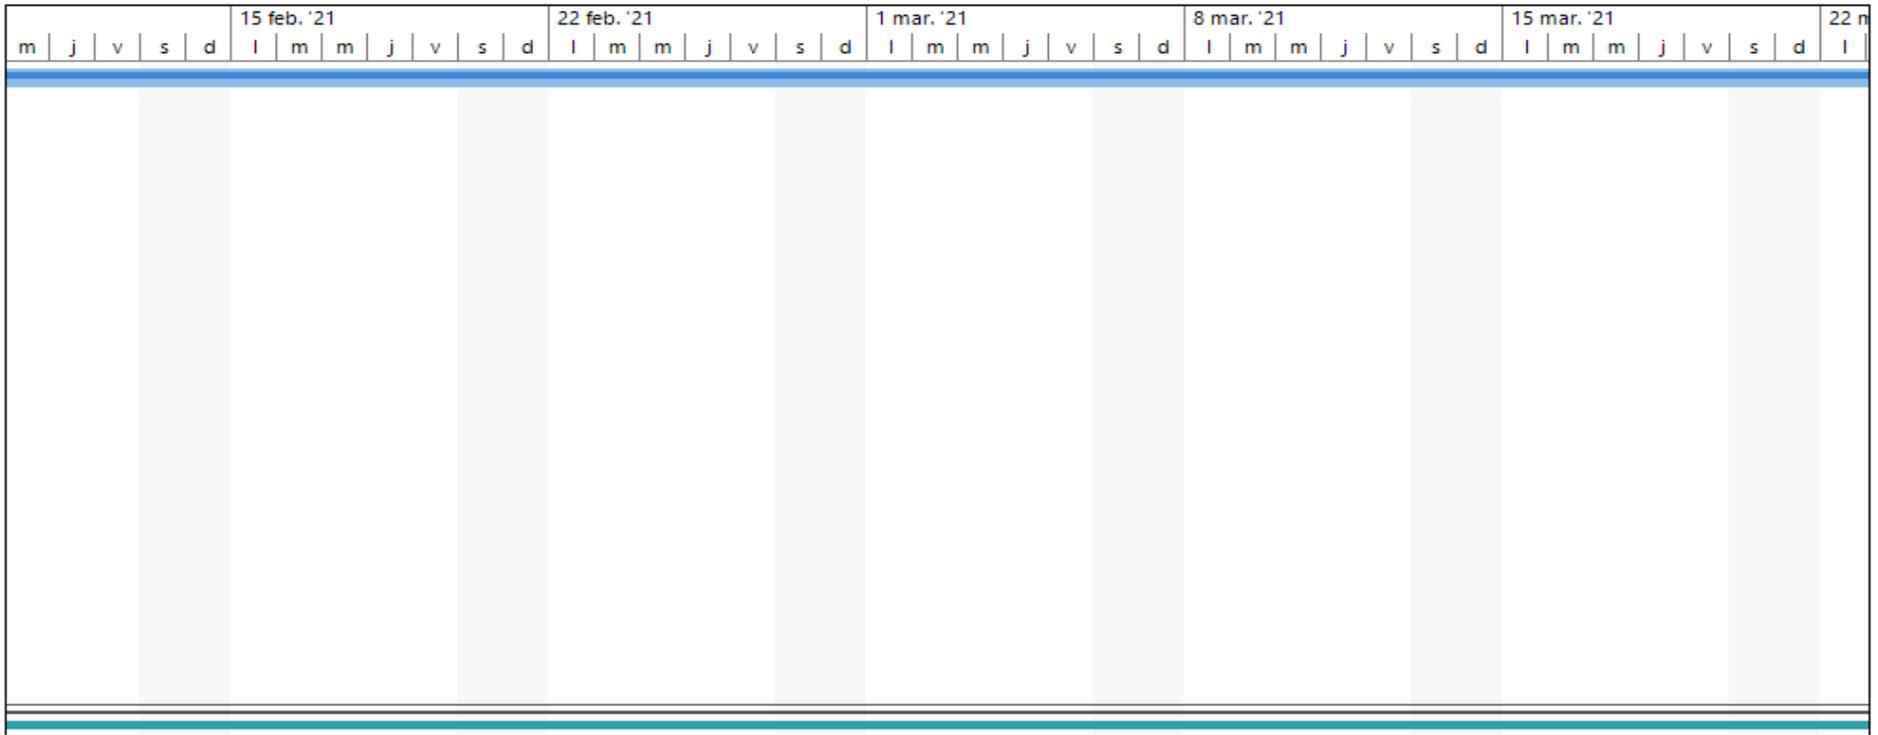


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital
Fecha: mar. 5/01/21 12:13

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

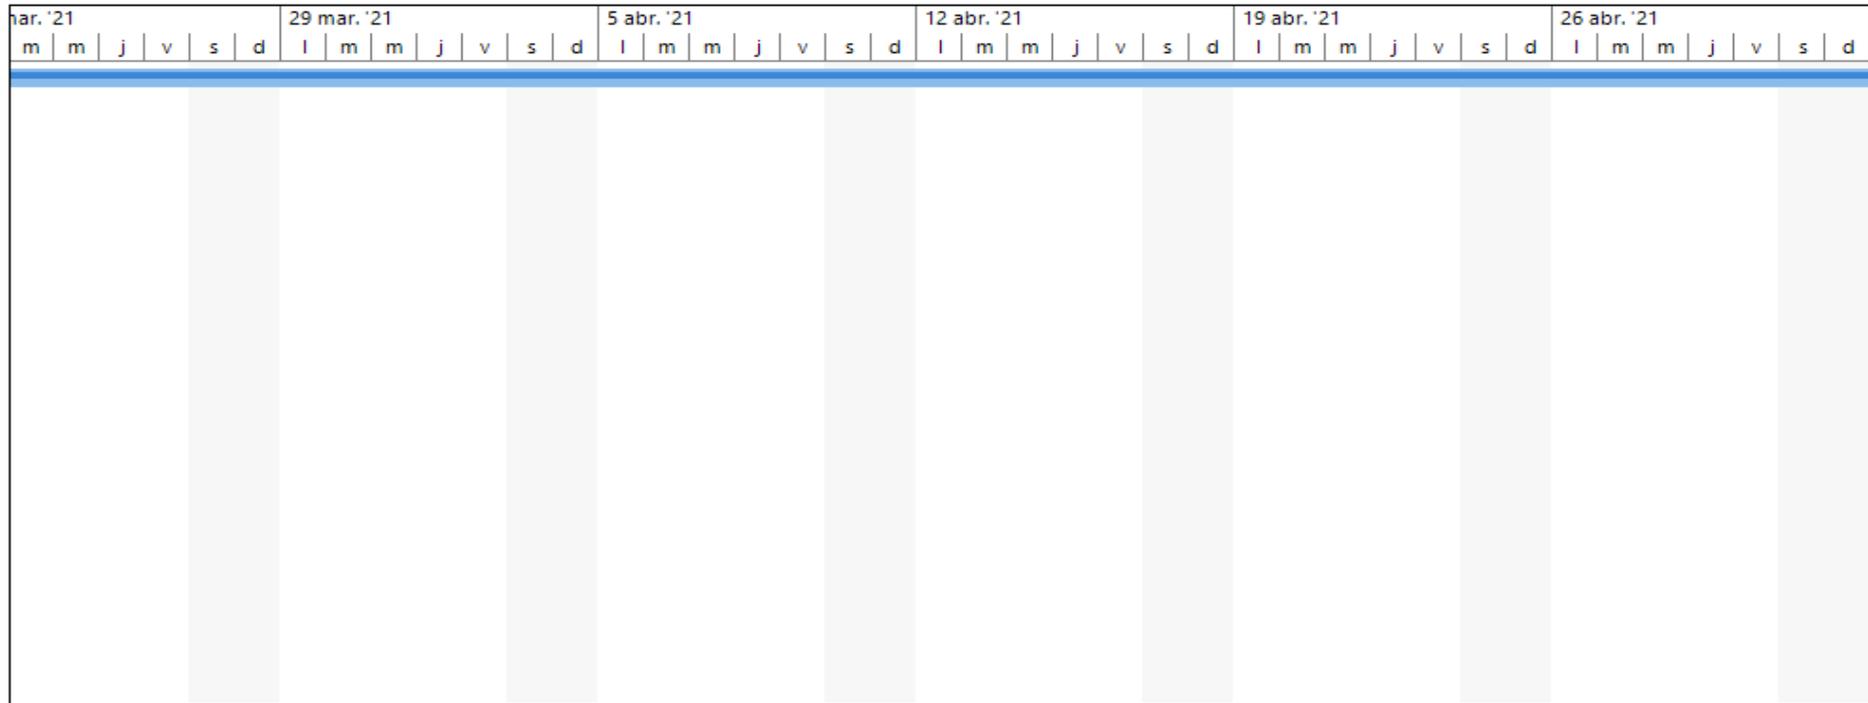


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital
 Fecha: mar. 5/01/21 12:13

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

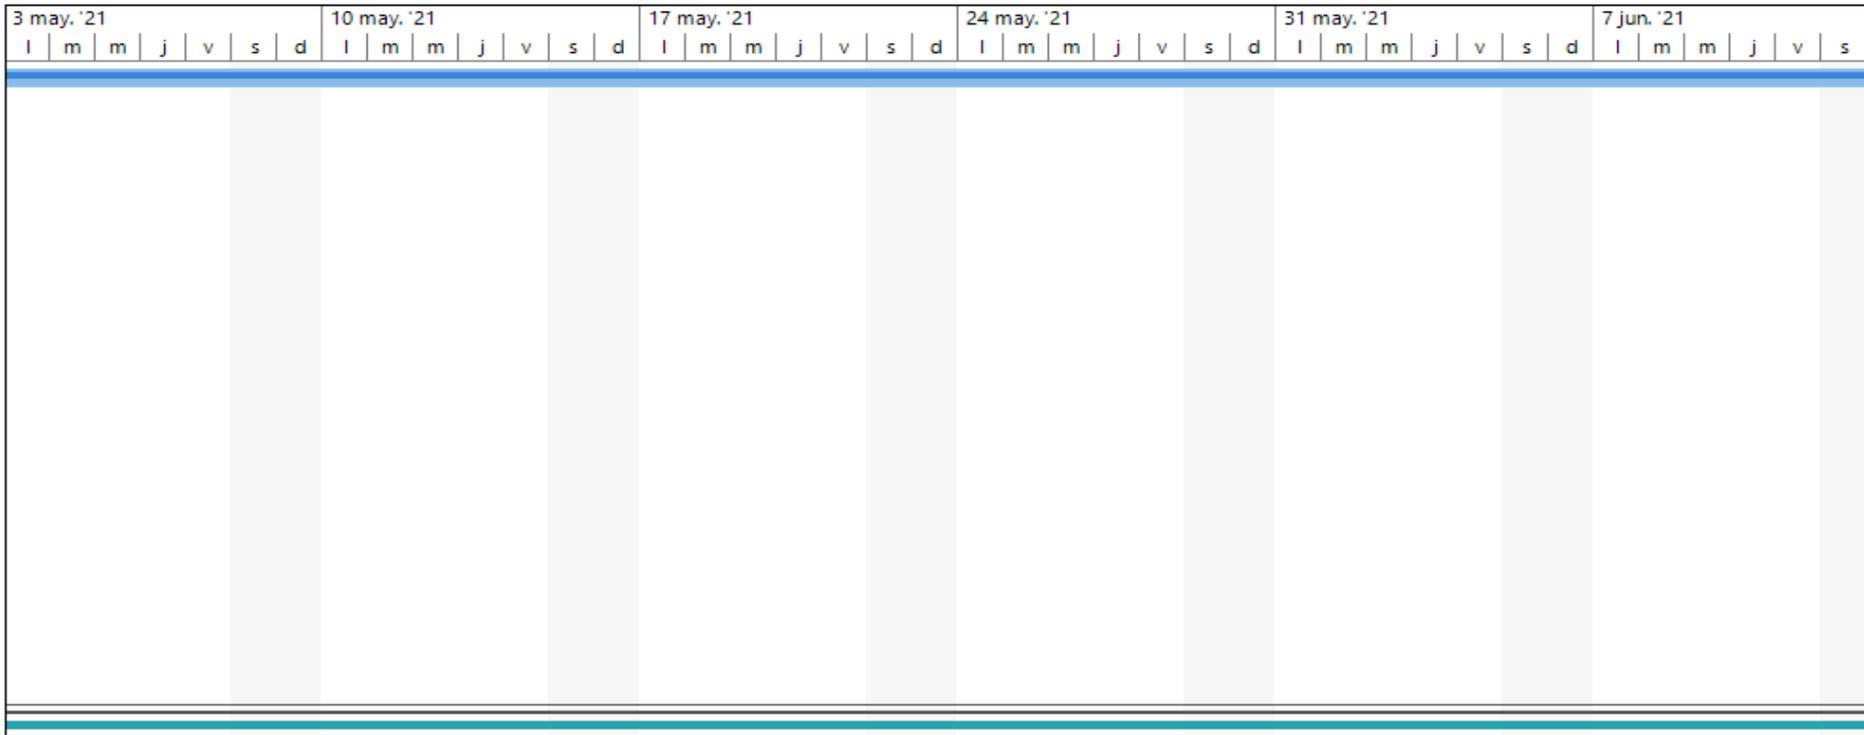



Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital
 Fecha: mar. 5/01/21 12:13

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

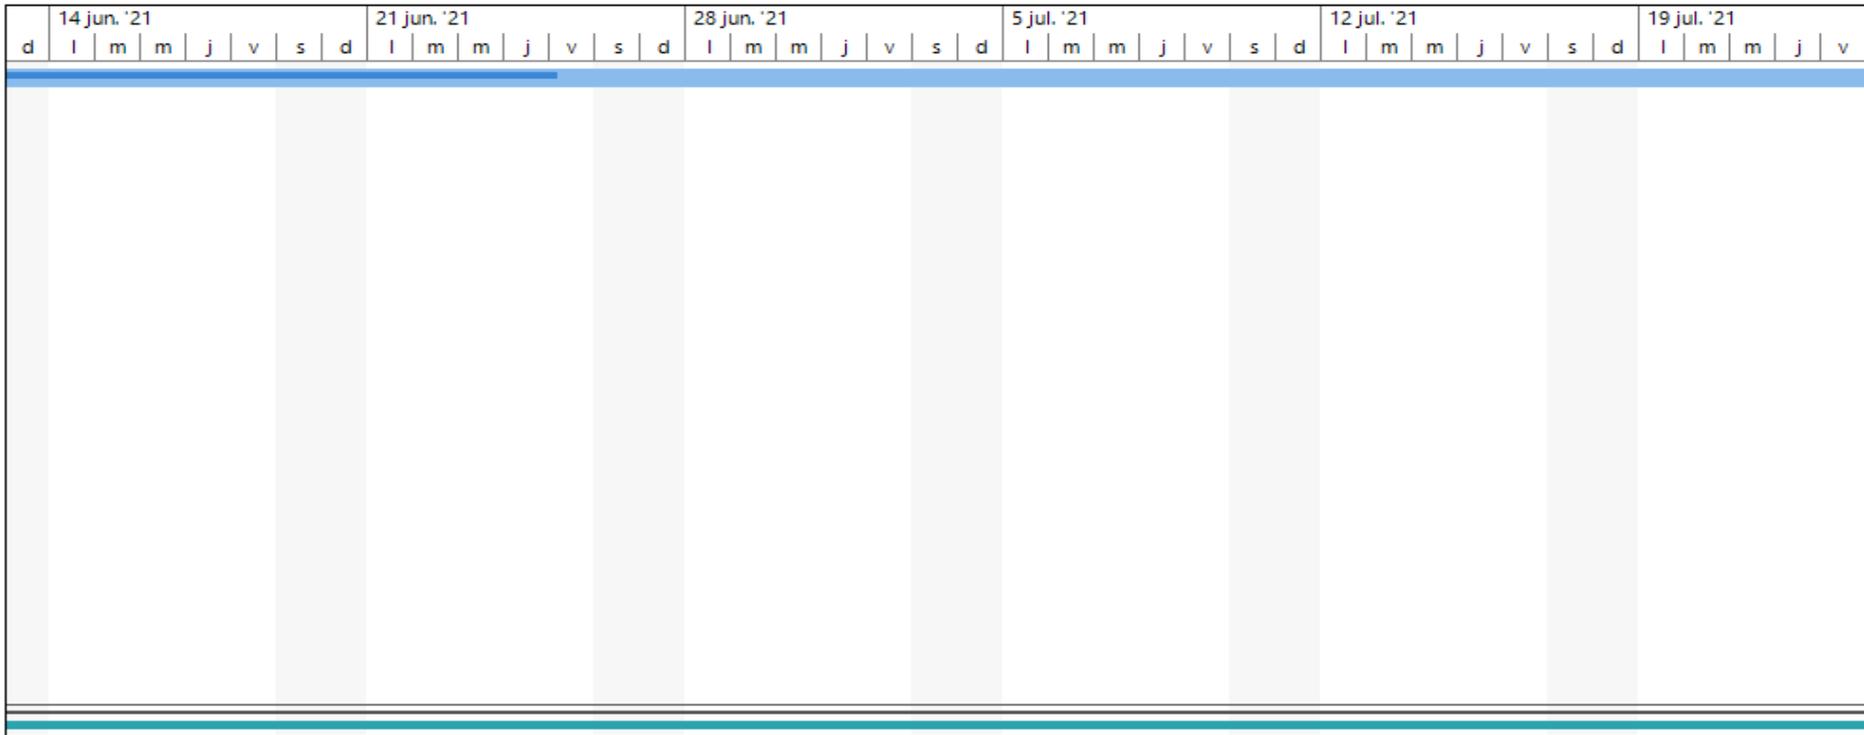

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital
Fecha: mar. 5/01/21 12:13

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

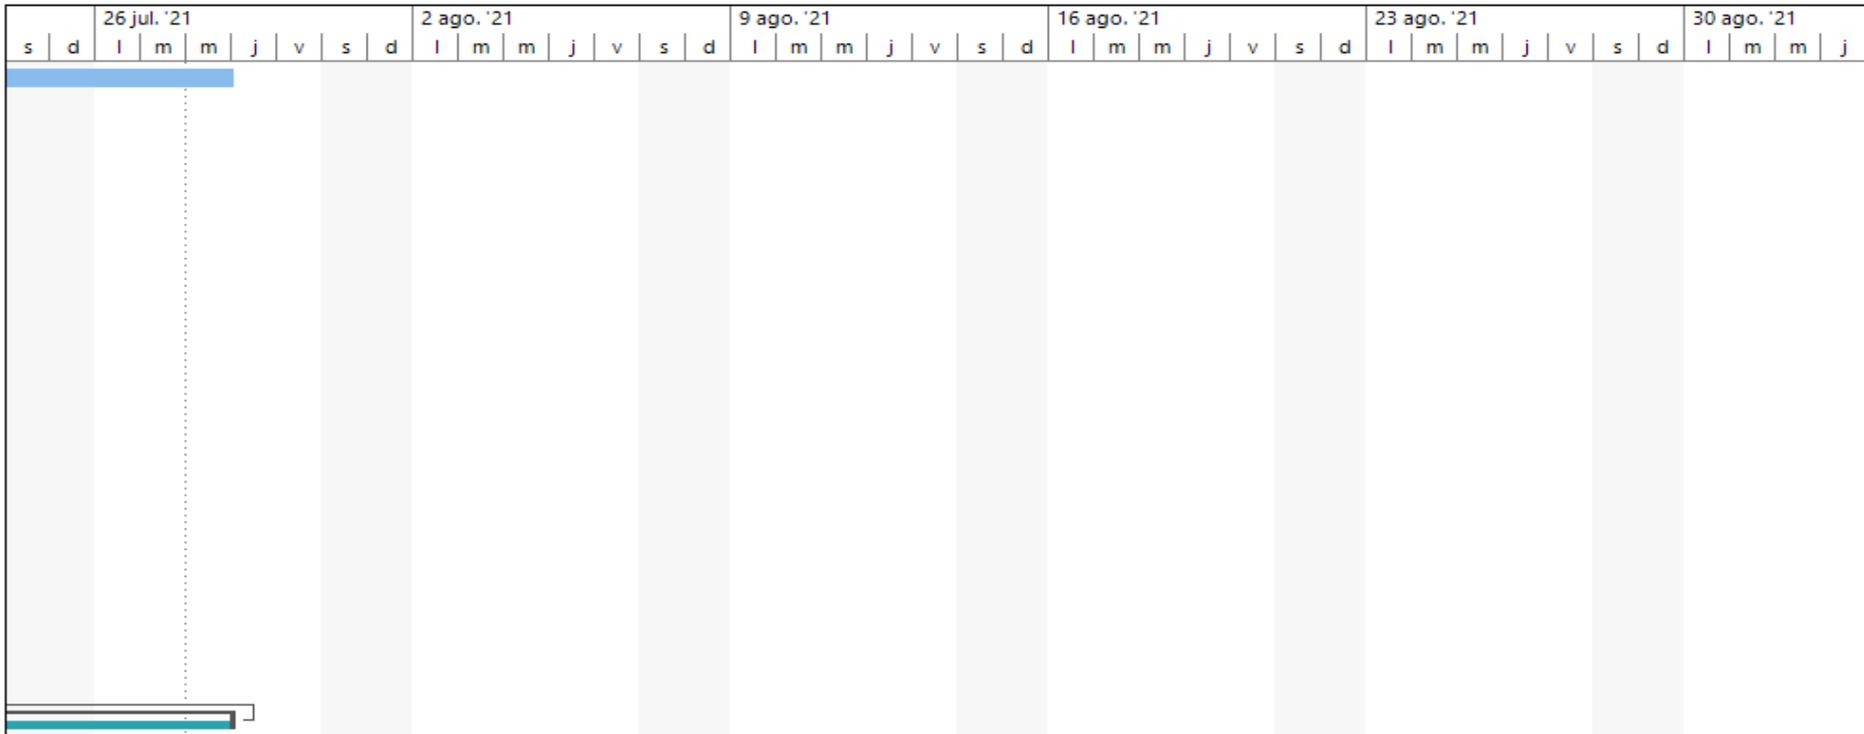

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

		Modo	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% Completado	j	v	s	d
18	✓		Activacion de soporte en portal ruckus	mié. 29/07/20	mié. 29/07/20	100%				
19			Avance tiempo gestion y soporte	mié. 29/07/20	mié. 28/07/21	48%				
20	✓		Entrega de documentacion	mar. 28/07/20	jue. 6/08/20 18	100%				
21	✓		Entrega de soportes de Renovacion	mar. 28/07/20	mié. 29/07/20	100%				
22	✓		Entrega de documentacion tecnica	mié. 29/07/20	jue. 6/08/20 18	100%				
23	✓		Facturacion	vie. 7/08/20 8:	vie. 14/08/20 1	100%				
24	✓		Entrega de Factura	vie. 7/08/20 8:	vie. 14/08/20 1	100%				

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital
Fecha: mar. 5/01/21 12:13

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			



Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			


31 ago. '20							7 sep. '20							14 sep. '20							21 sep. '20							28 sep. '20							5 oct. '20						
d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			


		12 oct. '20					19 oct. '20					26 oct. '20					2 nov. '20					9 nov. '20					16 nov. '20						
s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j


Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			


v	s	d	23 nov. '20			30 nov. '20			7 dic. '20			14 dic. '20			21 dic. '20			28 dic. '20								
			l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m




Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			


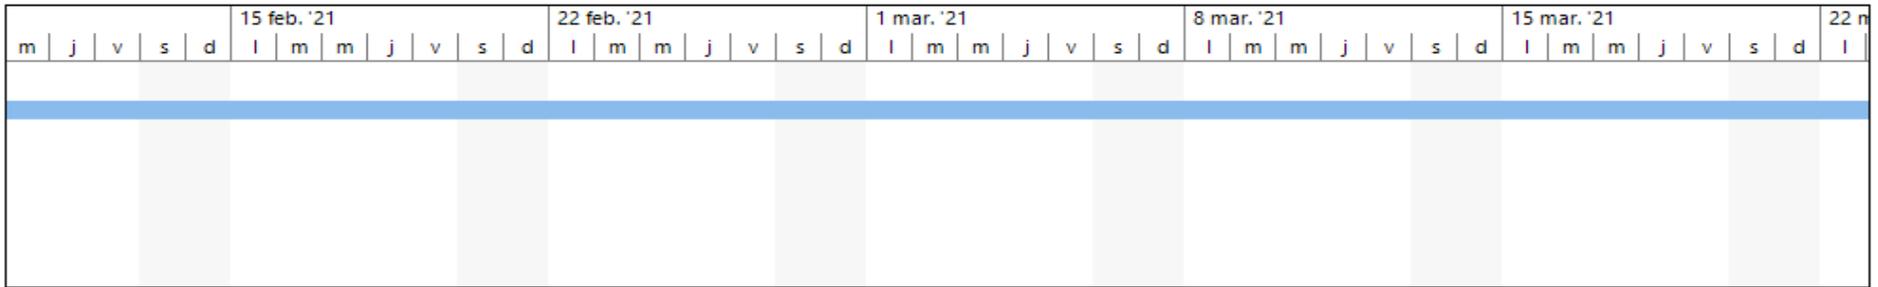



Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

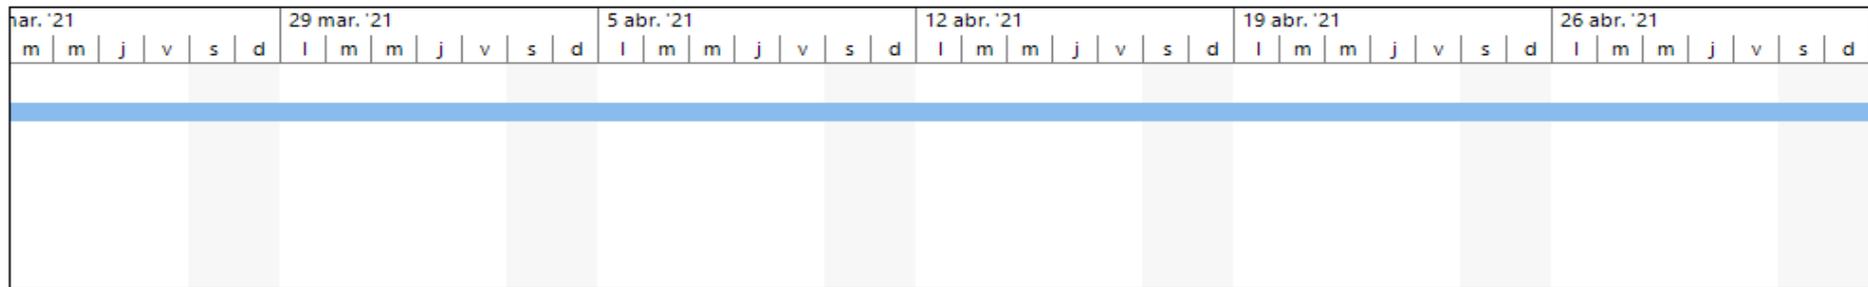

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

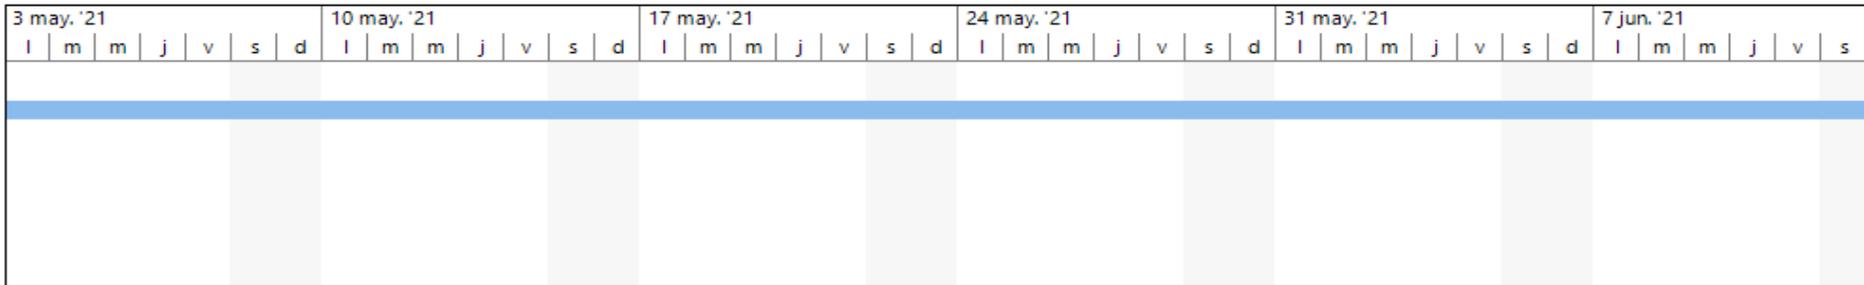

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

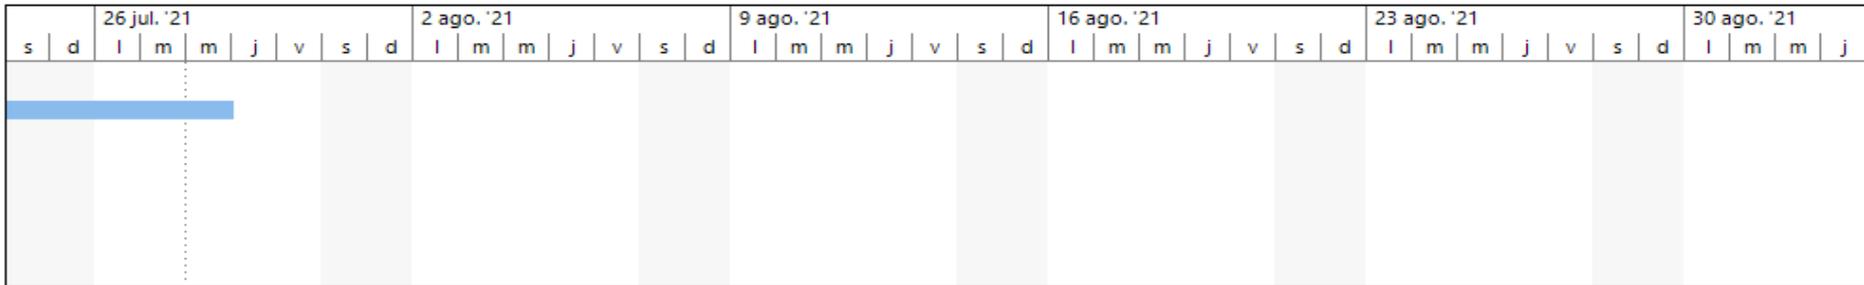

Proyecto: Renovacion Soporte Rickus Universidad Distrital Fecha: mar. 5/01/21 12:13	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			
